

# 工事概要書

平成30年7月6日  
橋本店・長谷川建設 共同企業体

〈工事概要〉 本工事は、「仙台市震災復興計画」(平成23年11月策定)に位置付けられた県道塩釜亘理線等の道路のかさ上げを実施するため、施行するものである。

〈工事名〉 仙台市東部復興道路整備事業  
 蒲生東通1号線外3線道路新設改良工事(岡田新浜工区・その5)  
 〈工事場所〉 仙台市宮城野区蒲生字小田切～蒲生字細川 地内  
 〈工期〉 自)平成28年12月21日～至)平成30年09月28日  
 〈請負金額〉 ¥1,365,570,360円 (内税 ¥101,153,360円)  
 〈施工監督〉 仙台市


建設局道路部南道路建設課  
 総括監督員 菅野 明彦  
 主任監督員 千葉 勝義  
 監督員 早坂 暁宏

〈請負者〉 橋本店・長谷川建設 共同企業体  
 東部復興 岡田新浜⑤作業所  
 所在地: 宮城県仙台市宮城野区蒲生字鍋沼31-3  
 現場代理人: 三浦 慎二郎 主任技術者: 菅野 一二  
 TEL:022-385-6152 FAX:022-385-6182

→ 今回検査対象

工種	種別	単位	数量	出来高	適用
道路土工	路体盛土	m <sup>3</sup>	41,397	11,988	
	路床盛土	m <sup>3</sup>	6,330	280	
	法面整形	m <sup>2</sup>	5,390		
地盤改良工		m <sup>3</sup>	31,231	100%	PB工法
法面工		m <sup>2</sup>	4,900		
擁壁工	津波防護壁工	式	1	100%	場所打杭Φ1.2mL29.0m
プレキャスト擁壁工		m	280	140	
補強土壁工	テールアルメ	m <sup>2</sup>	1,670		SP-IV(L17.5m)
カルバート工	場所打函渠工	式	1	100%	内空:B6500,H5600
	プレキャスト	式	1	100%	内空:B1000,H1300~1800
排水構造物工		式	1	25%	
橋梁下部工	A1橋台	基	1	100%	場所打杭Φ1.2mL29.0m
	A2橋台	基	1	100%	場所打杭Φ1.2mL29.0m
舗装工	下層路盤工	m <sup>2</sup>	2,336	1,670	
	表層工	m <sup>2</sup>	1,080	100%	
パイプライン工		式	1	100%	
仮設工	土留・仮締切工	式	1	100%	SP-3 L=9.5m
	ウェルポイント工	式	1	100%	
構造物撤去工		式	1	1	

今回検査対象工種  
 平成30年7月6日 検査官: -  
 平成30年6月30日 現在の進捗状況 70.60%  
 (予定 74.30%)

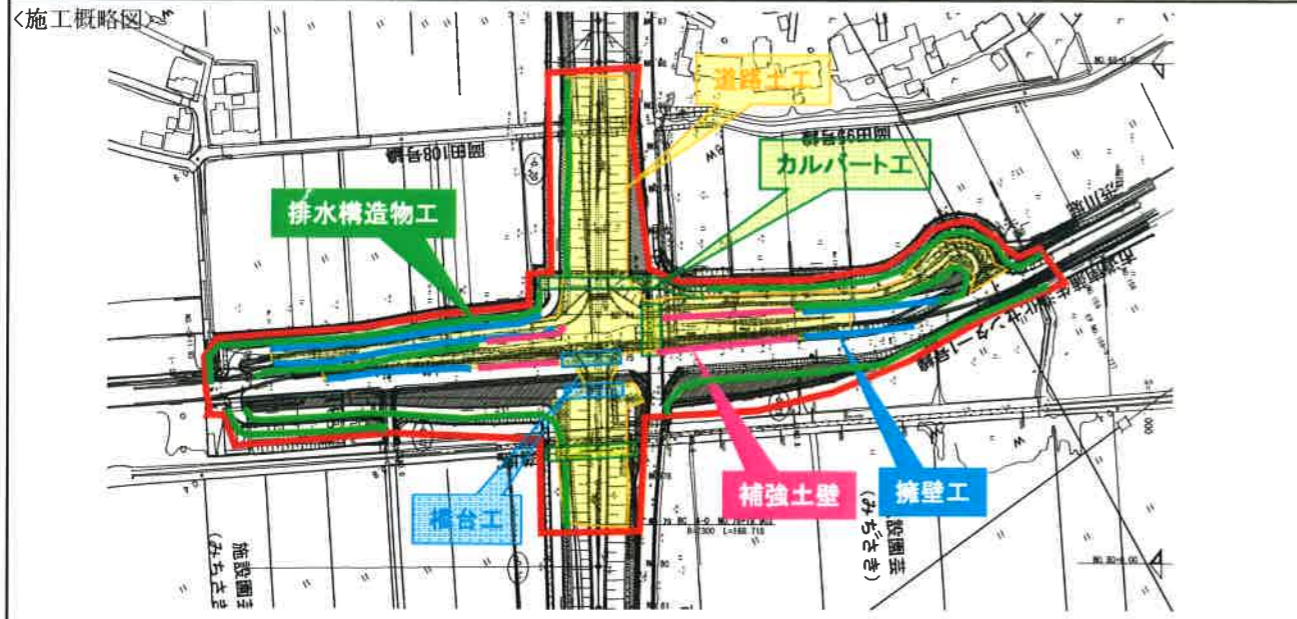

## 創意工夫・社会性に関する実施記録

創意工夫	1	緊急地震速報器の配備	創意工夫	14	熱中症対策
	2	土木現場用スマートフォンアプリの採用		15	コンクリートのひび割れ対策
	3	荷台への昇降設備の配備		16	コンクリートの打継処理
	4	レスキューベンチの配備		17	本体盛土工のGPS管理
社会性等	5	『工事のおしらせ』の掲示の工夫	社会性等	18	町内植樹活動への参加
	6	『見える化』重機停止時の注意喚起の工夫		19	近隣住民出入口の舗設
創意工夫	7	緊急時対応マニュアルの配布	創意工夫	20	盛土材の変更(承諾)
	8	色分け介錯ロープ・リフティングマグネットの使用			
	9	外部コンサルタントによる安全パトロール実施			
	10	自動追尾-現場用パソコンの活用			
社会性等	11	現場打集水桝→プレキャスト化			
	12	ドローン撮影による施工進捗管理			
	13	近隣清掃活動の実施			

